

鄂温克族自治县自然资源局




建设工程竣工规划核实意见书

核字第：1507242025HY0002598 号

建设单位(个人)	华能伊敏煤电有限责任公司
建设项目名称	伊敏电厂长距离供热工程
建设位置	鄂温克族自治县
建设规模	总用地面积：448788.62 平方米； 总建筑面积：7064.94 平方米，其中 1#中继 泵站 3532.47 m ² ； 2#中继泵站 3532.47 m ² ； 管线长度：69962.50 米。
建设工程规划 许可证编号	建字第：150724202500001 号
备注	2020-150724-44-03-008904


根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《内蒙古自治区城乡规划条例》第四十五条，同意通过建设工程竣工规划核实。

附件：规划核实平面图

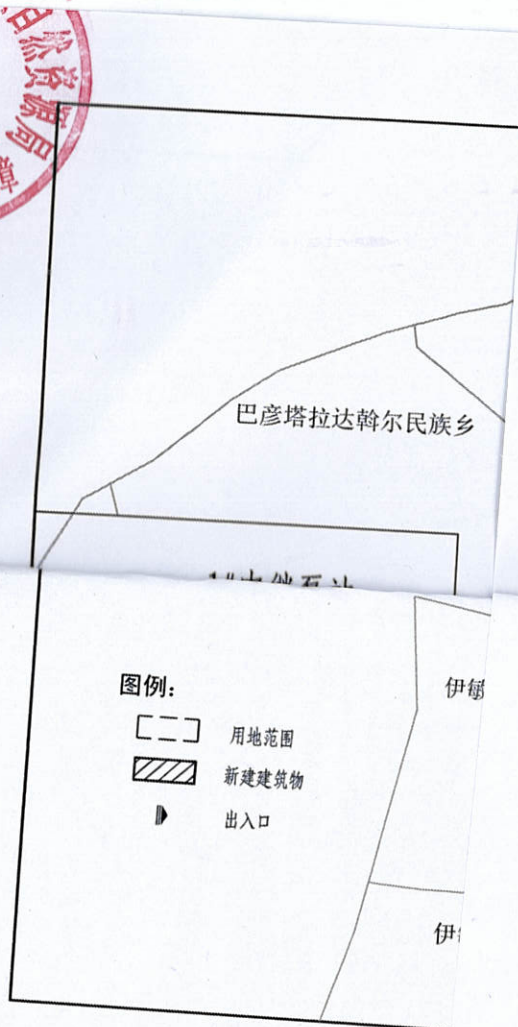

鄂温克族自治旗自然资源局

2025年2月8日

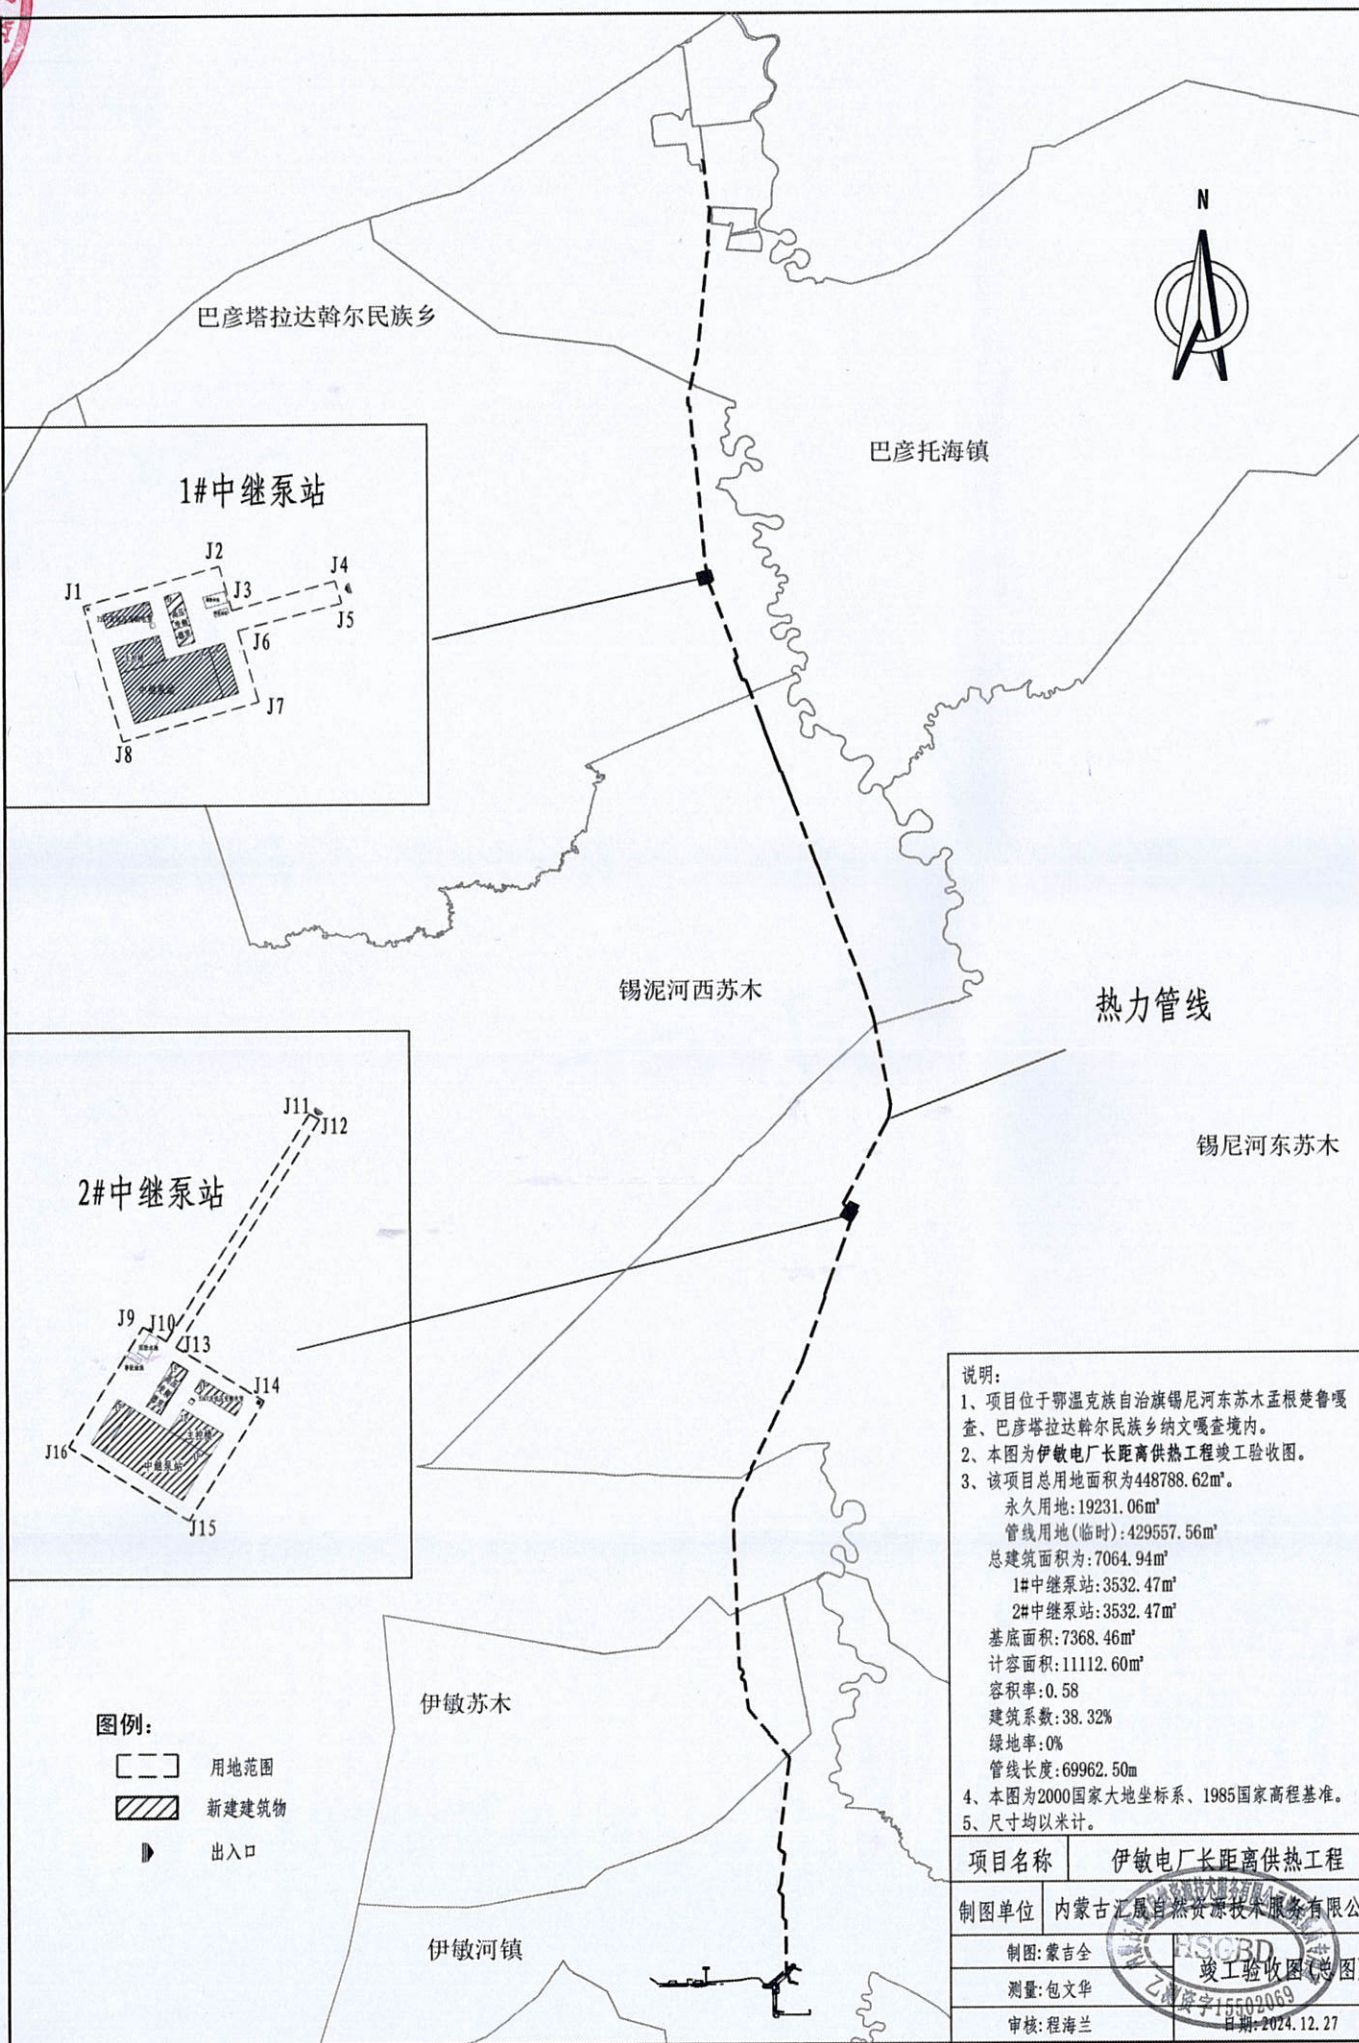


- 图例:
- 用地范围
 - 新建建筑物
 - 出入口

说明:

- 1、项目位于鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根楚鲁嘎查、巴彦塔拉达斡尔民族乡纳文嘎查境内。
- 2、本图为伊敏电厂长距离供热工程竣工验收图。
- 3、该项目总用地面积为448788.62m²。
永久用地:19231.06m²
管线用地(临时):429557.56m²
总建筑面积为:7064.94m²
1#中继泵站:3532.47m²
2#中继泵站:3532.47m²
基底面积:7368.46m²
计容面积:11112.60m²
容积率:0.58
建筑系数:38.32%
绿地率:0%
管线长度:69962.50m
- 4、本图为2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
- 5、尺寸均以米计。

项目名称	伊敏电厂长距离供热工程		
制图单位	内蒙古汇晨自然资源技术服务有限公司		
制图:蒙古全			竣工收图
测量:包文华			
审核:程海兰	日期:2024.12.27		

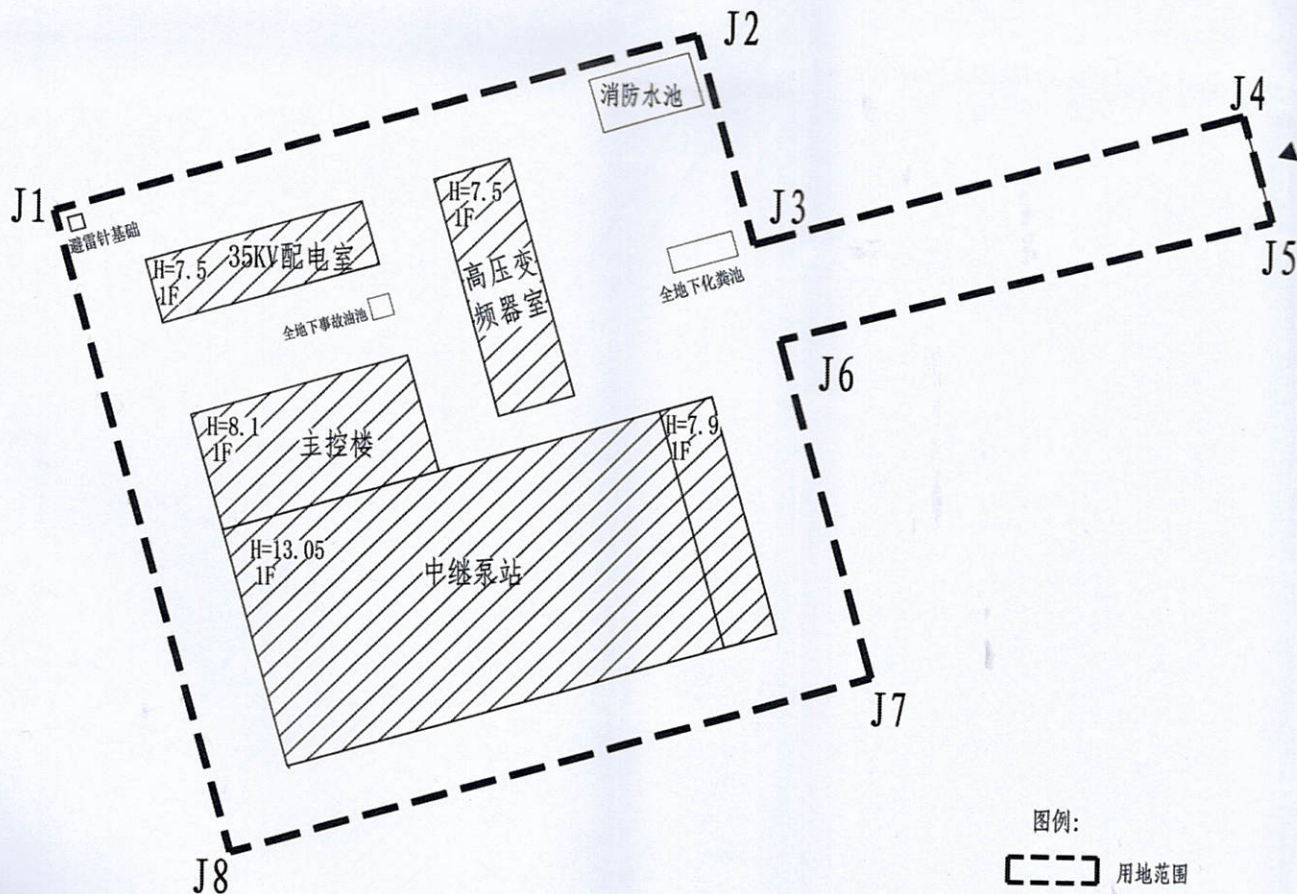

图例:

--- 用地范围

/// 新建建筑

► 入口方向

1#中继泵站用地范围坐标表

点号	X	Y	边长
J1	5429968.795	40480189.435	92.00
J2	5429994.308	40480277.827	
J3	5429965.520	40480286.134	
J4	5429984.250	40480353.489	
J5	5429969.755	40480357.759	15.11
J6	5429952.402	40480289.922	70.01
J7	5429905.916	40480303.340	48.38
J8	5429880.403	40480214.948	92.00
J1	5429968.795	40480189.435	92.00
S=9469.96 平方米			

说明:

1、项目位于鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根楚鲁嘎查、巴彦塔拉达斡尔民族乡纳文嘎查境内。

2、本图为伊敏电厂长距离供热工程竣工验收图。

3、该项目总用地面积为448788.62m²。

永久用地:19231.06m²

管线用地(临时):429557.56m²

总建筑面积为:7064.94m²

1#中继泵站:3532.47m²

主控楼:512.94m² 中继泵站:2376.39m²

35KV配电室:278.10m² 高压变频器室:365.04m²

2#中继泵站:3532.47m²

主控楼:512.94m² 中继泵站:2376.39m²

35KV配电室:278.10m² 高压变频器室:365.04m²

基底面积:7368.46m²

计容面积:11112.60m²

容积率:0.58

建筑系数:38.32%

绿地率:0%

管线长度:69962.50m

4、本图为2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。

5、尺寸均以米计。

项目名称 伊敏电厂长距离供热工程


制图单位 内蒙古汇晟自然资源技术服务有限公司

制图:蒙古全

测量:侯琦

审核:程海兰

日期:2024.12.27

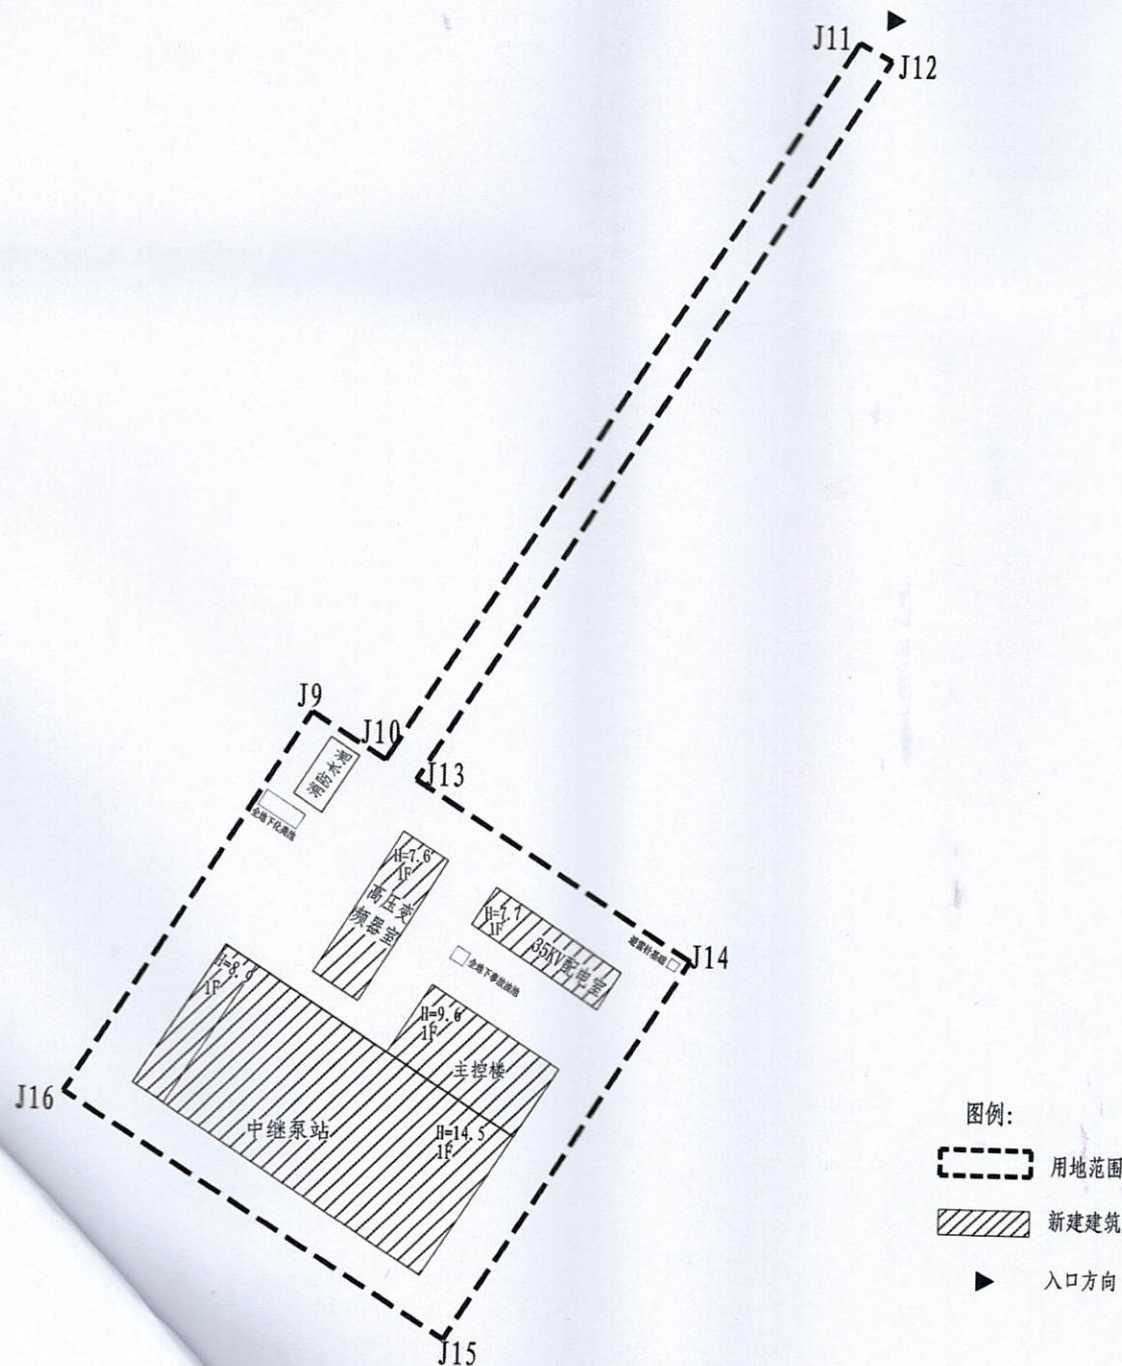

2#中继泵站用地范围坐标表

点号	X	Y	边长
J9	5407400.149	40485288.373	17.73
J10	5407390.756	40485303.411	174.66
J11	5407538.226	40485396.998	7.44
J12	5407534.749	40485403.574	175.19
J13	5407386.828	40485309.700	66.85
J14	5407351.410	40485366.402	92.00
J15	5407273.381	40485317.663	92.00
J16	5407322.120	40485239.634	92.00
J9	5407400.149	40485288.373	92.00
S=9761.10 平方米			

说明:

- 1、项目位于鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根楚鲁嘎查、巴彦塔拉达斡尔民族乡纳文嘎查境内。
- 2、本图为伊敏电厂长距离供热工程竣工验收图。
- 3、该项目总用地面积为448788.62m²。
永久用地:19231.06m²
管线用地(临时):429557.56m²
总建筑面积为:7064.94m²
1#中继泵站:3532.47m²
主控楼:512.94m² 中继泵站:2376.39m²
35KV配电室:278.10m² 高压变频器室:365.04m²
2#中继泵站:3532.47m²
主控楼:512.94m² 中继泵站:2376.39m²
35KV配电室:278.10m² 高压变频器室:365.04m²
基底面积:7368.46m²
计容面积:11112.60m²
容积率:0.58
建筑系数:38.32%
绿地率:0%
管线长度:69962.50m
- 4、本图为2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
- 5、尺寸均以米计。

项目名称

伊敏电厂长距离供热工程

制图单位

内蒙古汇晟自然资源技术服务有限公司

制图:蒙古全

测量:侯琦

审核:程海兰

日期:2024.12.27
